

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國110年9月29日

發文字號：營署都字第1101193989號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：UESNDF)

主旨：檢送本署110年度9月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署110年9月17日營署都字第1101187708號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、都市計畫組、悠創科技股份有限公司、中華民國綠野生態保育協會(均含附件)

署長 吳欣修



本署 110 年度 9 月份第 2 次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」執行會議紀錄

開會時間：110 年 9 月 23 日（星期四）09 時 30 分

貳、地點：本署 105 會議室（視訊會議）

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫：

（一）所有競爭型計畫各工程標案應於計畫屆期前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領，請於 110 年 9 月 30 日前積極辦理請款作業，未於期限內完成者，後續經費將由縣(市)政府自籌。

（二）執行進度落後之縣市：目前基隆市政府、彰化縣政府、嘉義縣政府之競爭型計畫執行進度仍嚴重落後，請提出施工計畫及於標案管理系統下載最新進度資料及落後原因與解決對策，於下次檢討會提出說明，並請上開 3 縣市政府請務必專案督導趕辦。

1. 基隆市政府：

（1）「基隆山海城串聯再造計畫工程」山上標工程（基隆希望之丘鵲橋通廊計畫已併入山上標來執行）工程進度為 80.1%，鵲橋工區未有實際工進，致整體工區工程進度嚴重落後，為利於後續瞭解鵲橋工程實際進度，請單獨列項報告施工進度，並請市府專案督導後續工程執行，本案應於 110 年 9 月底前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

(2)「基隆山海城串聯再造計畫工程」山下標工程進度為 65.82%，進度嚴重落後，請市府專案督導後續工程執行，應於 110 年 9 月底前竣工，並完成工程結算，以請領第 4 期補助款。

2. 彰化縣政府：「田尾迎賓之心營造工程」工程進度為 45.88%，執行進度嚴重落後，又縣府與廠商終止合約後再重新上網後於 110 年 9 月 2 日決標，請縣府提出趕工計畫並專案督導趕辦，務必於 110 年 12 月 15 日前完成本案工程(怡心園 120 日、百景園 90 日)。

3. 嘉義縣政府：「大林慢城門戶計畫-大林驛站及育菁親水公園景觀改善工程」工程進度 64%，執行進度落後，請提趕工計畫，本案應於 110 年 9 月 30 日前竣工，並完成工程結算，請領第 4 期款。

二、「城鎮之心工程計畫」政策引導型計畫：

政策引導型四至六階段補助計畫請於 110 年 9 月 30 日前完工，並於 110 年 9 月 30 日前積極辦理請款作業，未於期限內完成者，後續經費將由縣(市)政府自籌。

(一) 苗栗縣政府：「泰安鄉士林村馬拉邦泰雅文化生態步道改善暨泰安鄉農產假日市集建置計畫」(工程進度 78%) 請加速辦理工程施作，並應於 110 年 9 月 30 日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

(二) 彰化縣政府：「109 年彰化縣竹塘鄉休閒公園遊憩環境改善計畫」(工程進度 92%) 請加速辦理工程施作，並應於 110 年 9 月 30 日前全數竣工，辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

(三) 雲林縣政府：「馬鳴山周邊休閒遊憩環境優化及社區空

間營造計畫」(工程進度 73%)請加速辦理工程施作，並應於 110 年 9 月 30 日前全數竣工，並辦理工程結算，完成所有補助款之請領。

三、108-109 年「城鎮之心工程計畫」各補助計畫之經費保留(已撥補助款但尚未實支部分 2.15 億元)核銷轉正執行進度說明如下：

(一)已完成所有經費門核銷之縣市：桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、嘉義市、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣。

(二)資本門尚未完成核銷之縣市：雲林縣(99.85%)、臺東縣(99.79%)、宜蘭縣(98.49%)、連江縣(93.72%)、南投縣(90.57%)、新北市(93.90%)、基隆市(65.17%)、高雄市(62.92%)、彰化縣(52.59%)、苗栗縣(65.2%)、嘉義縣(44.70%)、花蓮縣(61.84%)，請上開核銷進度落後之縣市積極趕辦，務必於 110 年 9 月 30 日前全數核銷完竣。

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
宜蘭縣	39,827,499	600,000	98.49%
新竹縣	7,853,648	0	100.00%
苗栗縣	85,363,023	29,704,287	65.20%
彰化縣	84,159,958	39,901,758	52.59%
南投縣	127,697,957	12,036,812	90.57%
雲林縣	45,008,618	67,546	99.85%
嘉義縣	88,864,960	49,141,711	44.70%
屏東縣	91,832,427	0	100.00%
臺東縣	89,050,152	190,229	99.79%
花蓮縣	71,787,183	27,392,052	61.84%
澎湖縣	36,957,044	0	100.00%
基隆市	97,713,392	34,033,893	65.17%
新竹市	21,939,297	0	100.00%

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
嘉義市	29,406,196	0	100.00%
高雄市	31,044,536	11,512,539	62.92%
新北市	65,261,465	3,978,773	93.90%
臺南市	106,629,535	0	100.00%
桃園市	6,141,560	0	100.00%
金門縣	107,297,693	0	100.00%
連江縣	59,306,140	3,725,748	93.72%
合計值	1,293,142,283	310,298,748	

(三)經常門尚未完成核銷之縣市：南投縣(70%)、高雄市(0.55%)，請上開核銷進度落後之縣市積極趕辦，務必於110年9月30日前全數核銷完竣。

縣市別	保留數	暫付數	核銷率
苗栗縣	1,394,000	0	100%
彰化縣	723,957	0	100%
南投縣	2,507,500	752,250	70%
雲林縣	1,025,500	0	100%
嘉義縣	1,062,000	0	100%
屏東縣	1,437,500	0	100%
臺東縣	1,260,000	0	100%
花蓮縣	675,000	0	100%
澎湖縣	810,000	0	100%
基隆市	1,327,500	0	100%
新竹市	1,168,000	0	100%
嘉義市	1,200,000	0	100%
高雄市	2,379,468	2,366,400	0.55%
新北市	330,000	0	100%
臺南市	600,000	0	100%
合計值	17,900,425	3,118,650	

(四)轉入110年度未撥保留款經費部分(尚有2.45億元)請於110年9月30日前完成請款，若該筆經費未能於本年度完成請款實支之案件，因本期計畫已屆期，本署不再辦理經費保留，該款項請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。未撥保留經費如下，請各直轄市、縣(市)政府積極辦理請款作業：

縣市別	未撥保留經費(元)
宜蘭縣	1,851,718
新竹縣	3,865,885
苗栗縣	6,842,330
彰化縣	51,375,438
南投縣	39,786,524
雲林縣	0
嘉義縣	9,429,099
屏東縣	14,816,376
臺東縣	2,145,761
花蓮縣	3,614,499
澎湖縣	693,577
基隆市	40,321,890
新竹市	1,300,499(無須再請領)
嘉義市	3,420,583
高雄市	8,345,220
新北市	13,794,305
臺中市	17,937,108
臺南市	1,464,246(無須再請領)
桃園市	2,557,162
金門縣	13,850,979
連江縣	7,438,734
合計值	244,851,933

四、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」預算執行落後，請各直轄市、縣(市)政府逐案控管每案工程及請款進度。

(一)各縣市請款進度表：

縣市別	經常門	資本門	合計值(元)
宜蘭縣	2,550,000	763,725	3,313,725
新竹縣	0	0	0
苗栗縣	810,000	2,390,850	3,200,850
彰化縣	734,795	4,802,895	5,537,690
南投縣	752,250	3,029,400	3,781,650
雲林縣	1,785,000	11,140,440	12,925,440
嘉義縣	1,882,440	5,657,400	7,539,840
屏東縣	0	0	0
臺東縣	945,000	3,204,334	4,149,334
花蓮縣	810,000	4,767,462	5,577,462
澎湖縣	1,890,000	5,670,000	7,560,000
基隆市	765,000	0	765,000
新竹市	720,000	0	720,000
嘉義市	1,680,000	7,904,000	9,584,000
高雄市	0	0	0
新北市	1,950,000	4,906,397	6,856,397
臺中市	720,000	4,560,000	5,280,000
臺南市	0	0	0
桃園市	1,365,000	24,175,000	25,540,000
金門縣	840,000	1,404,000	2,244,000
連江縣	900,000	3,042,911	3,942,911
合計值	21,099,485	87,418,814	108,518,299

(二)各縣市核定數及已完成工程簽約並請款之案件統計表：目前尚未請款之縣市為新竹縣、屏東縣、高雄市、臺南市等4縣市，請上開縣市加速辦理請款作業。

縣市別	競爭型 核定數	政策型 核定數	已完成工程 發包案件數	尚未完成發 包案件數
宜蘭縣	1	8	6	3
新竹縣	1	10	4	7
苗栗縣	1	7	2	6
彰化縣	1	9	3	7
南投縣	1	7	2	6
雲林縣	1	5	4	2
嘉義縣	1	13	5	9
屏東縣	1	11	5	7
臺東縣	1	10	4	7
花蓮縣	0	10	8	2
澎湖縣	1	6	2	5
基隆市	1	7	3	5
新竹市	1	7	5	3
嘉義市	1	6	2	5
高雄市	1	6	2	5
新北市	1	7	5	3
臺中市	1	8	4	5
臺南市	1	7	0	8
桃園市	2	6	5	3
金門縣	1	6	3	4
連江縣	1	7	4	4
合計值	21	163	78	106

五、請各直轄市、縣(市)政府務必依以下管控時程積極趕辦，如未達以上要求之補助案件，本署將請縣市辦理撤案或請縣市自籌經費辦理：

- (一)「環境景觀總顧問計畫」及「社區規劃師駐地輔導計畫」：未於110年8月31日前請領第1期款之縣市，請務必於110年9月30日前請領。

(二)政策型第一階段之工程案：請於110年9月20日前完成工程簽約並請領第1期款；尚在細部設計書審之案件，請壓縮審查作業時間並積極趕辦，最遲務必於9月30日前辦理工程上網，不得再有延宕情形，所有案件須於110年12月15日竣工，請領所有補助款項。

(三)政策型第二階段(包含地方創生城鄉風貌營造第一階段)之工程案：應於110年9月15日前完成細部設計規劃作業，並於110年9月30日前辦理工程上網；並於110年10月20日前完成工程簽約，請領第1期補助款，不得再有延宕情形，所有案件須於110年12月15日工程進度至少達70%以上，請領所有補助款項。

(四)競爭型計畫：請於110年12月15日前完成工程簽約並請領第1期補助款項，未積極辦理完成第1期補助款項，將不辦理預算保留，請各直轄市、縣(市)政府自籌經費辦理。

柒、散會：12時00分

110年度9月份第2次「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」執行會議(視訊會議)

簽到表

一、日期：110年9月23日(星期四)


二、地點：本署105會議室

三、會議主持人：廖組長耀東


廖耀東

四、出席單位及人員

單位或人員	簽名	備註
廖組長耀東		
廖副組長建順		
本案工作小組		
吳秘書代理科長政彥	吳政彥	
韋副工程司理淳	韋理淳	
吳技士星憲	吳星憲	
劉約聘研究員文菁	劉文菁	
江派駐工程師柏蔚	江柏蔚	
葉派駐工程師沛廷	葉沛廷	
縣市單位		
基隆市政府洪志健	以視訊方式參與會議	
基隆市政府留柏萱	以視訊方式參與會議	
新北市政府陳兆揚	以視訊方式參與會議	
新北市政府潘以晞	以視訊方式參與會議	
桃園市政府丁宏欣	以視訊方式參與會議	
桃園市政府李政陽	以視訊方式參與會議	
新竹市政府宋晏聞	以視訊方式參與會議	




新竹縣政府莊艾耘	以視訊方式參與會議	
新竹縣政府秦嘉珮	以視訊方式參與會議	
新竹縣政府莊雅淳	以視訊方式參與會議	
苗栗縣政府邱得維	以視訊方式參與會議	
臺中市政府余昌樺	以視訊方式參與會議	
臺中市政府吳保寬	以視訊方式參與會議	
彰化縣政府陳盈利	以視訊方式參與會議	
彰化縣政府何曉萍	以視訊方式參與會議	
南投縣政府王信賢	以視訊方式參與會議	
南投縣政府廖俊雄	以視訊方式參與會議	
南投縣政府楊佩臻	以視訊方式參與會議	
南投縣政府劉一中	以視訊方式參與會議	
雲林縣政府林健溢	以視訊方式參與會議	
雲林縣政府吳佳怡	以視訊方式參與會議	
嘉義縣政府蘇煒翔	以視訊方式參與會議	
嘉義市政府翁靖儀	以視訊方式參與會議	
臺南市政府吳翰屏	以視訊方式參與會議	
高雄市政府張巍羸	以視訊方式參與會議	
屏東縣政府陳經緯	以視訊方式參與會議	
屏東縣政府賴彥禎	以視訊方式參與會議	
屏東縣政府張詠斯	以視訊方式參與會議	
宜蘭縣政府劉秀蘭	以視訊方式參與會議	
宜蘭縣政府李明哲	以視訊方式參與會議	
宜蘭縣政府王心怡	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府許芳瑀	以視訊方式參與會議	
花蓮縣政府黃煒婷	以視訊方式參與會議	
臺東縣政府李宸玲	以視訊方式參與會議	
澎湖縣政府徐玉萍	以視訊方式參與會議	
金門縣政府孫宥宸	以視訊方式參與會議	
金門縣政府曾子雲	以視訊方式參與會議	
金門縣政府陳書逸	以視訊方式參與會議	
連江縣政府朱國樑	以視訊方式參與會議	
連江縣政府高語婕	以視訊方式參與會議	

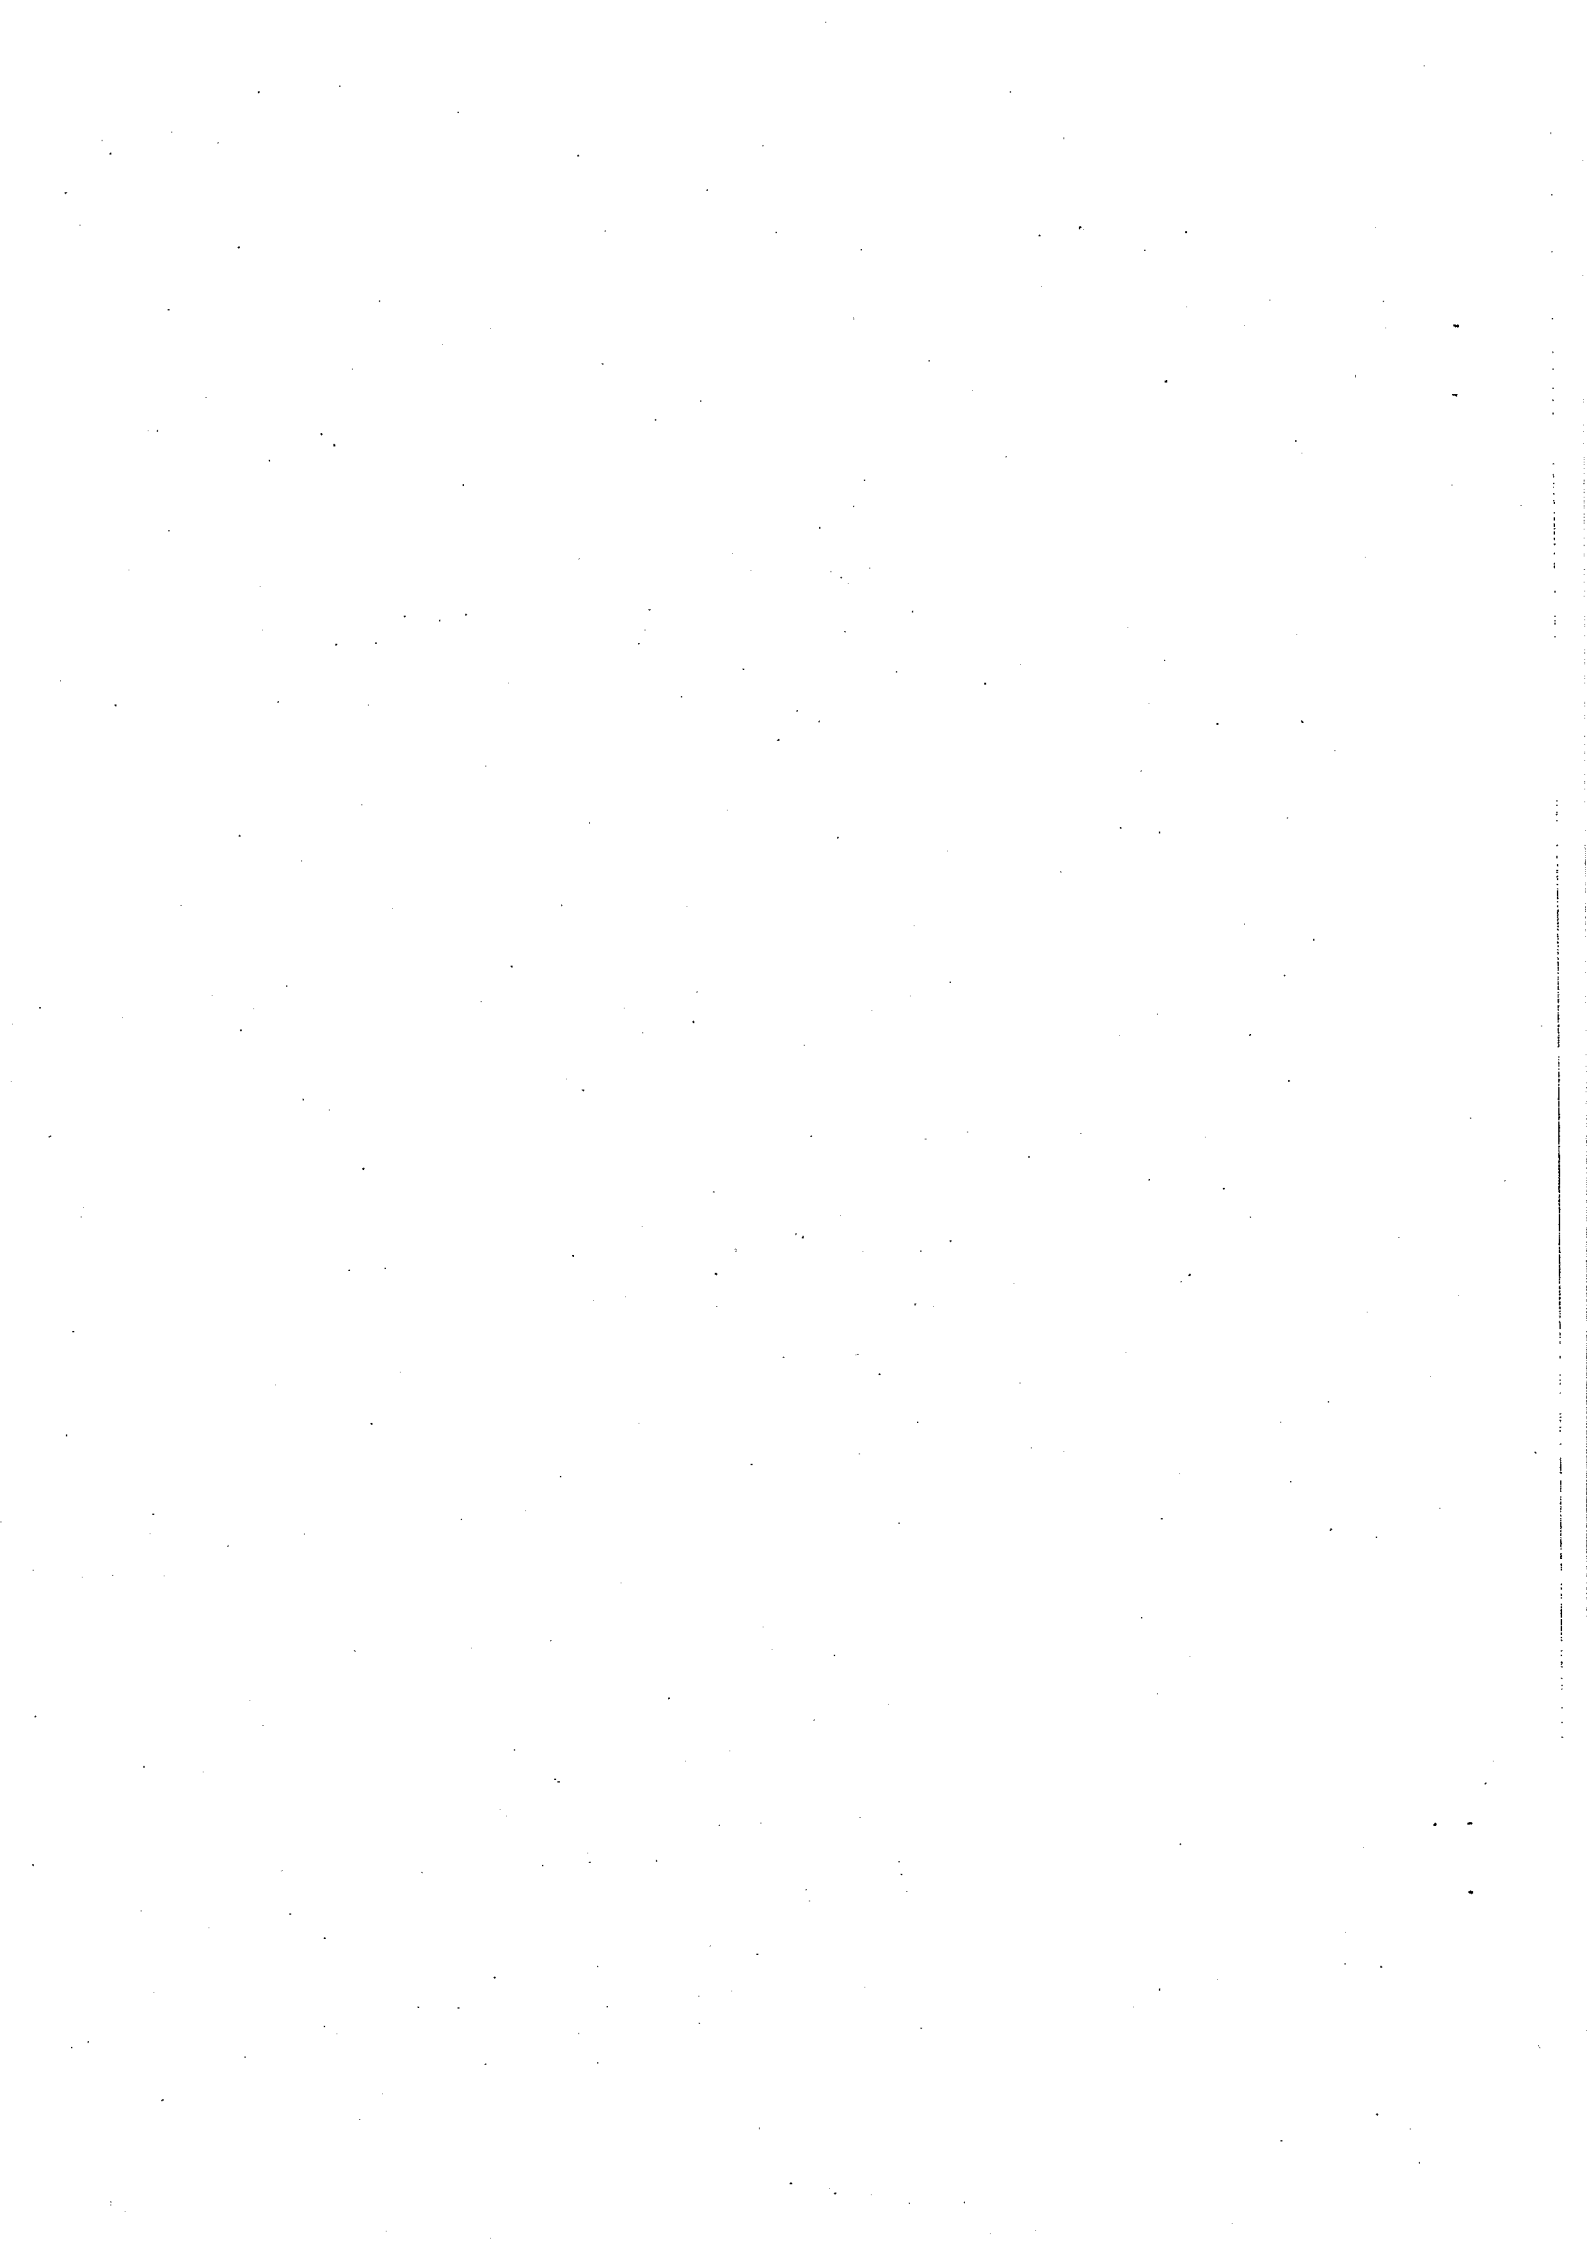

列席者		
綠野協會郭雅萍	以視訊方式參與會議	
綠野協會楊明歡	楊明歡	

上開以視訊方式參與會議人員經確認無誤。

業務主管單位：


 東莞市
 綠野協會
 會長 廖耀東

會議主席：

